# Planification de projet — PERT & Gantt



## Énoncé proposé (illustration)

Planifier le développement d’un mini-site web à partir des tâches ci-dessous.
Déterminer les dates au plus tôt/au plus tard, les marges et le chemin critique.

| Code | Tâche | Durée | Précédent | Début + | Fin + | Début - | Fin - | Marge | Critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Analyse des besoins | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | **Oui** |
| **B** | Maquettage | 3 | A | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | **Oui** |
| **C** | Architecture technique | 2 | A | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | Non |
| **D** | Intégration interface | 4 | B | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | **Oui** |
| **E** | Développement API | 4 | C | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | Non |
| **F** | Tests et validation | 2 | D, E | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | **Oui** |
| **G** | Mise en ligne | 1 | F | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | **Oui** |

## Réseau PERT simplifié (activités sur les nœuds)

Dans chaque bloc : durée, dates au plus tôt et marge.

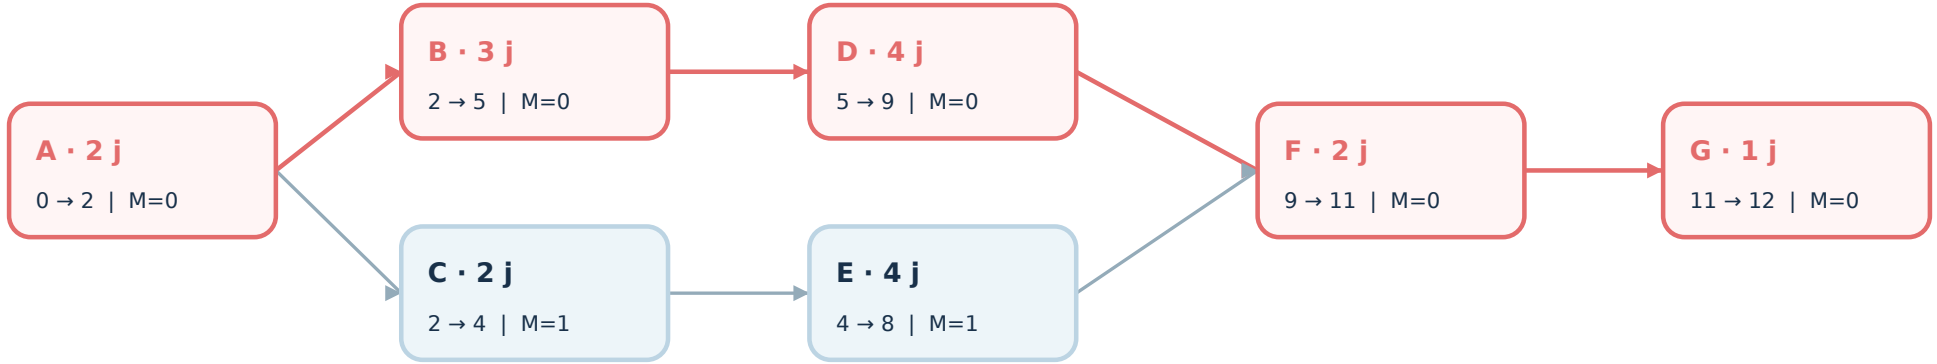


**Durée totale = 12 jours | Chemin critique : A → B → D → F → G**

# Planification de projet — PERT & Gantt



## Diagramme de Gantt — calendrier au plus tôt

Durées et dépendances issues du tableau de la page 1 (jour 1 = début du projet).

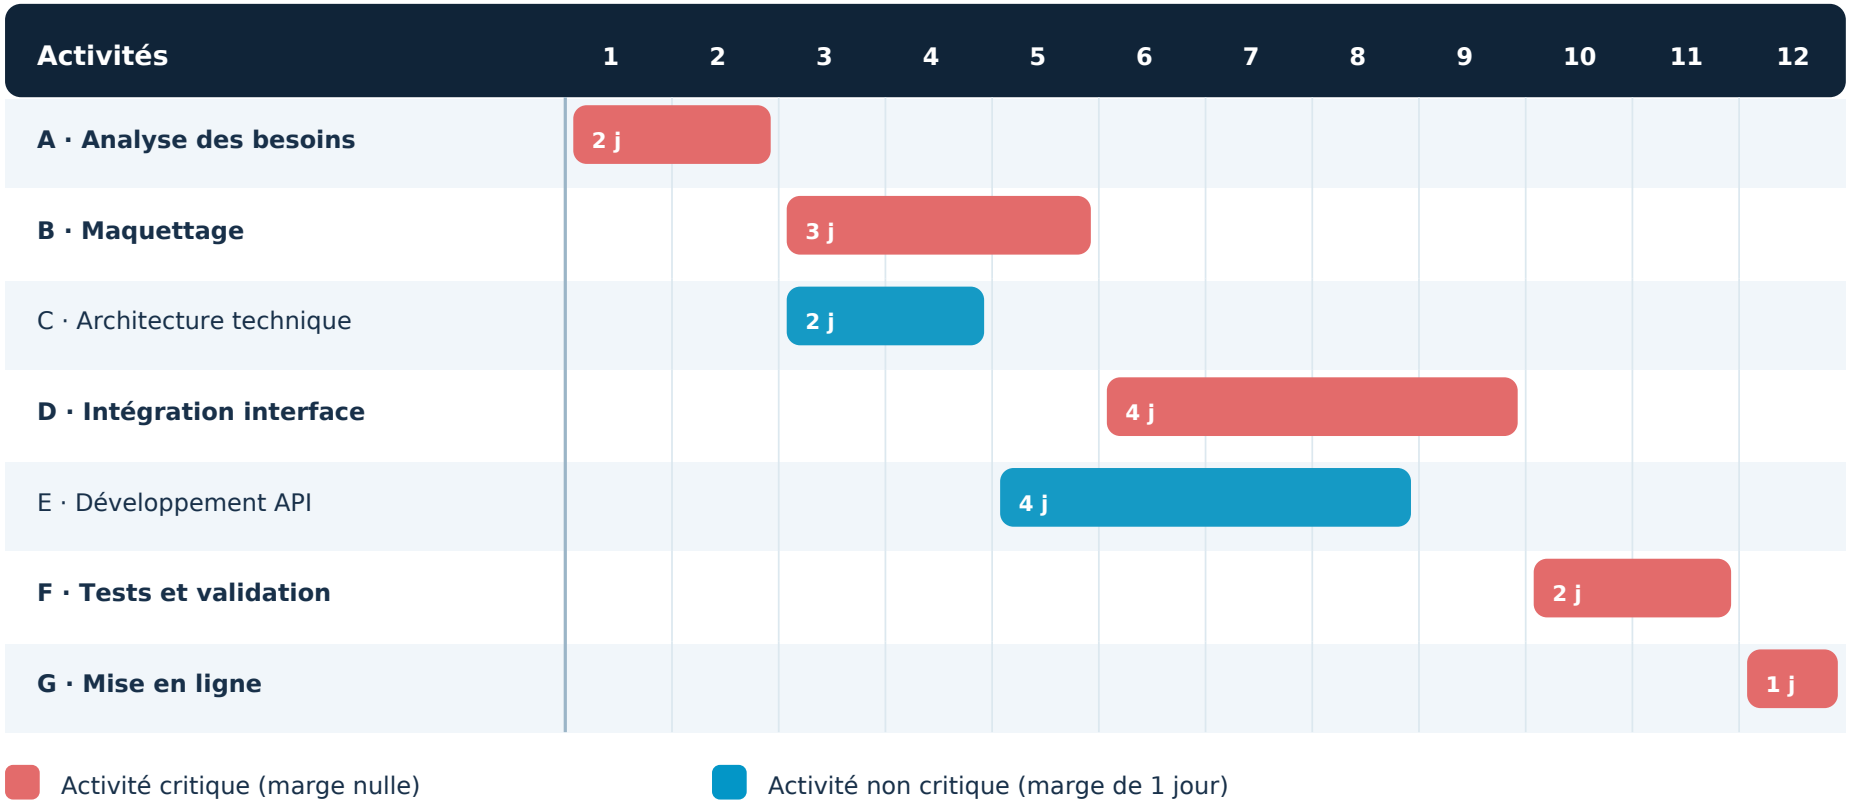


Ordonnancement : A, puis B/C en parallèle ; D/E ; F quand D et E sont terminées ; G.

Le diagramme est un exercice pédagogique original, et non une transcription vérifiée du sujet officiel.
